



M e s t o TURZOVKA
Stred 178, 023 54 Turzovka

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Mesto Turzovka, so sídlom Turzovka, ul. Jašíkova 178, 02354 **odstupuje** od zmluvy o dielo č. V-005/2017 zo dňa 18.5.2017 uzatvorenej s USD Lučenec s.r.o. so sídlom Gagarinova č. 2897/32 Lučenec IČO 47575832 podľa článku XI tejto zmluvy s tým, že účinky odstúpenia nastávajú doručením tejto listiny druhej zmluvnej strane.

Obsahom zmluvného záväzku bolo aby zhotoviteľ USD Lučenec vykonal stavebné práce spojené s rozšírením kapacít hrobových miesta na Novom cintoríne podľa vypracovanej projektovej dokumentácie v rozsahu zadávacích podkladov a za podmienok stanovených v zmluve.

Podľa článku V tejto zmluvy o dielo I. etapa – terasa III mala byť vykonávaná v súlade s harmonogramom tak aby ukončenie bolo vykonané do 10/2017. Podľa zmluvy zhotoviteľ mal odovzdať dielo do 31.9.2017, čo však neurobil.

Podľa záznamu Ing. Červeníka, je stavba v rozpracovaní, neukončená a tento obsahuje, čo bolo vykonané a čo je potrebné vyhotoviť. Vid' príloha č. 1 Rekapitulácia a kontrola harmonogramu stavebných prác.

Na základe toho, že dielo nebolo vyhotovené v lehote určenej zmluvou, boli naplnené podmienky na odstúpenie od zmluvy podľa článku XI tejto zmluvy tým, že zhotoviteľ:

- Realizuje preukázateľne predmet zmluvy v rozpore s dohodnutými podmienkami zmluvy,
- Je v omeškaní viac ako 10 dní oproti dohodnutému harmonogramu.

Dielo nebolo vykonané i napriek ústnym príslubom zhotoviteľa, čo má za následok ohrozenie pochovávaní na danom cintoríne.

Z uvedených dôvodov bolo potrebné odstúpiť od predmetnej zmluvy. Finančné vyrovnanie a odovzdanie staveniska bude predmetom samostatných zápisníc.



MESTO TURZOVKA
023 54

Primátor
JUDr. Ľubomír Golis

USD Lučenec s.r.o.
Ľubomír Drugda
Dňa 3.11.2017

úsal

da

722

3P

1. 2017



V Turzovke dňa

okružla pečiatka mesta podpis:



M e s t o T U R Z O V K A

Úsek výstavby a rozvoja mesta

REKAPITULÁCIA A KONTROLA HARMONOGRAMU STAVEBNÝCH PRÁC

Na stavbe „*Nový cintorín – rozšírenie kapacít hrobových miest – I.Etapa – Terasa III*“
ku dátumu **03.11.2017**

Podľa zmluvy o dielo č.V-005/2017 zo dňa 18.05.2017 sú termíny I.etapy – Terasa III nasledovné:

- **Začatie:**
do 3 dní od prevzatia staveniska, , prevzatie staveniska prebehlo dňa 25.05.2017
- **Ukončenie:**
1.časť (výstavba terasy, resp. terás bez spojovacích chodníkov a terénnych úprav), lehota realizácie do 06/2017
2.časť (spojovacie chodníky a konečné terénne úpravy), lehota realizácie najneskôr do 10/2017

Podľa zmluvy o dielo č.V-005/2017 zo dňa 18.05.2017 a priloženého riadkového harmonogramu stavebných prác, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť prílohy zmluvy sú termíny I.etapy – Terasa III nasledovné:

- Vid'. riadkový harmonogram (príloha č.1)

Po vizuálnej obhliadke je reálny stav zrealizovaných a zabudovaných stavebných prác výrobkov na stavbe „*Nový cintorín – rozšírenie kapacít hrobových miest – I.Etapa – Terasa – III*“ ku dnešnému dňu t.j. 03.11.2017 nasledovný:

Zrealizované stavebné práce:

- Zemné práce
- Dodávka a montáž trativodov z flexibilného potrubia DN 100
- Dodávka a montáž zvislých a kompletných konštrukcií z betónových tvárnic Premac DT15-DT25, s betónovou zálievkou a zabudovanou výstužou

Nezrealizované stavebné práce:

- Dodávka a montáž založenia parkového trávnik.....543,43 m²
- Dodávka a montáž zámkovej dlažby hr. 6cm s podkladnými vrstvami.....164,20 m²
- Dodávka a montáž lavičiek dĺžky 180 cm.....4 ks

Mestský úrad Turzovka
Stred 178

IČO: 00314331
DIČ: 2020553315

Tel.: +421/41/420 93 40
Fax: +421/41/420 93 16

e-mail: jan.cervenik@turzovka.sk
webová stránka: www.turzovka.sk

023 54 Turzovka

Číslo účtu IBAN: SK50 5600 0000 0002 0461 7002 PRIMA BANKA SLOVENSKO. a. s.

- Dodávka a montáž staveniskových prefabrikátov hr.6-8 cm.....1200 ks
- Dodávka a montáž záhonových obrubníkov.....237,60 m
- Dodávka a montáž záhradných obrubníkov.....242,40 ks
- Dodávka a montáž žľaboviek.....46,20 m
- Dodávka a montáž betónových blokových terénnych schodov.....1 ks
- Dodávka a montáž priepustu pod terénne schody.....1 ks
- Dodávka a montáž zelene(tuje, okrasné smreký).....27 ks
- Konečné terénne úpravy

V Turzovke dňa 03.11.2017 vypracoval



vedúci výs

Prílohy

- Riadkový harmonogram stavebných prác, zmluvy č.V-005/2017 zo dňa 18.05.2017

Nový cintorín - rozšírenie kapacít hrobových miest

Úlohy

SA III

a dodávky HSV

é práce

danie

a kompletne konstrukcie

nikácie

ané konstrukcie a práce

SA IV

a dodávky HSV

é práce

danie

a kompletne konstrukcie

nikácie

ané konstrukcie a práce

SA V

a dodávky HSV

é práce

danie


a kompletne konstrukcie

nikácie

ané konstrukcie a práce

ok realizácie 8.5.2017

vitel: USD Lučenec, s.r.o. Gagarinova 32,984

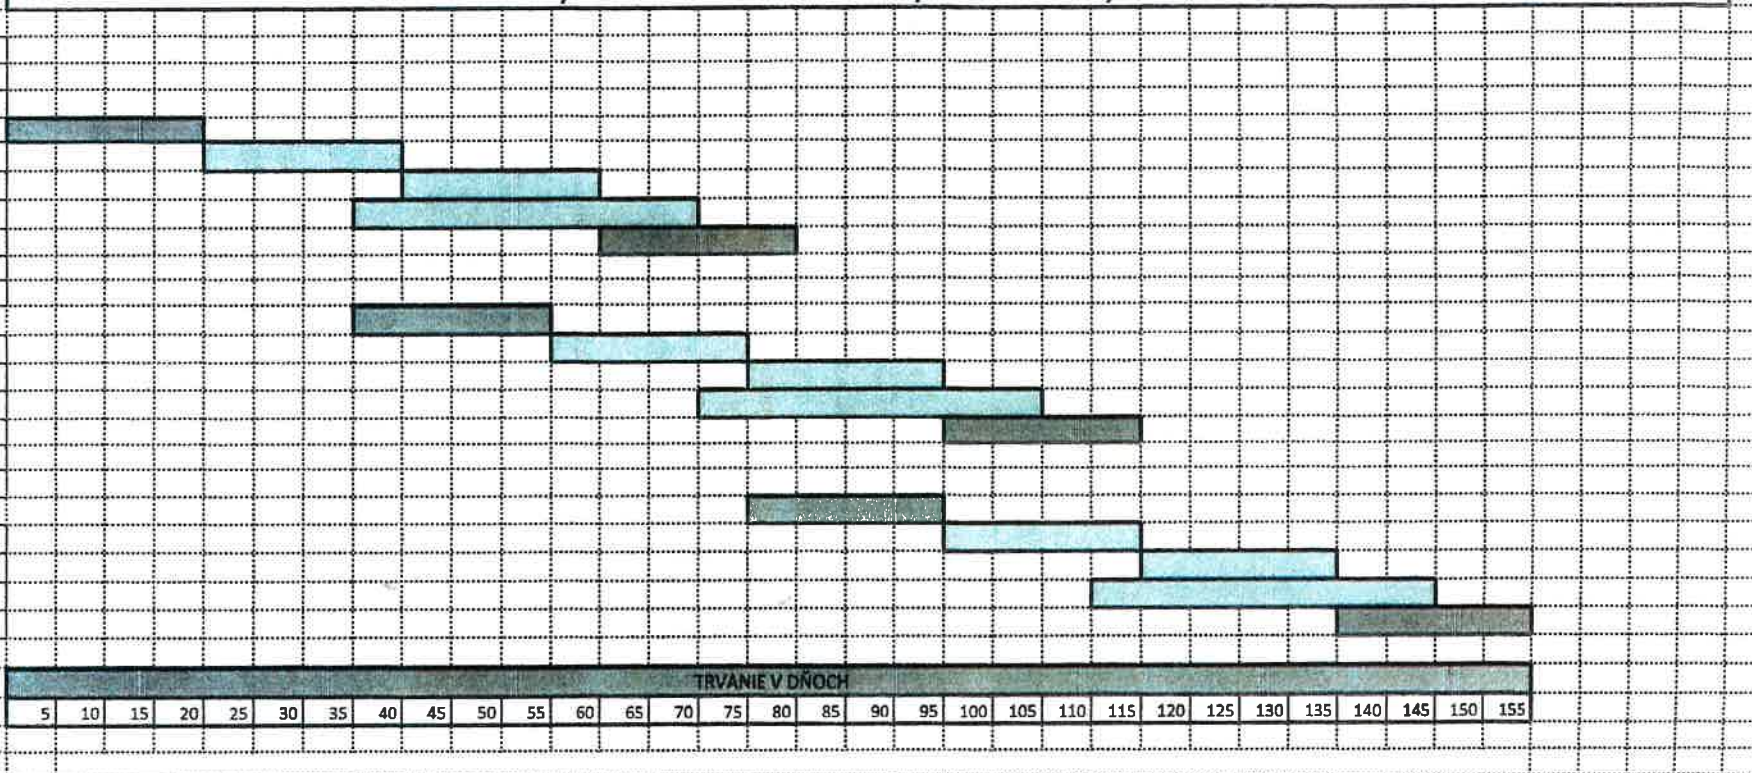

USD 1991
 čenec s.r.o.
 7/32, 984 03 Lučenec
 Č DPH: SK2023997371
 2006000
